Phone : +(221) 76.026.88.15
+(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOOYNYX
E-mail : aim-gooo@asecna.org
Web : https:ais.asecna.aero

AIP SUP
NR 31/A/25GO
27 MAY, 2025

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

TRAVAUX D'EXTENSION DE L'AILE SUD DE LA NOUVELLE AEROGARE DE L'AEROPORT DE LOME

EXTENSION WORK ON THE SOUTH WING OF THE NEW TERMINAL BUILDING AT LOMÉ AIRPORT

/

TOGO

DXXX

Mise en vigueur/*Effective Date*	27 Mai 2025 /*May 27, 2025*
Validité/Validity	31 Décembre 2025/*December 31th, 2025*

Introduction

Le présent supplément AIP décrit les différentes phases des travaux d'extension de l'aile Sud de la nouvelle aérogare de l'Aéroport de Lomé.

Introduction

This AIP supplement describes the different phases of the extension work on the South wing of the new terminal at Lomé Airport.

Description de la zone concernée et période des travaux :

La nouvelle aérogare de l'Aéroport International GNASSINGBE EYADEMA (AIGE) s'étend sur une superficie de 21 000 m². Le projet consiste à augmenter la capacité de cette aérogare de 2608,48 m² supplémentaire. Le site d'exécution des travaux (Voir en annexe schéma illustratif) se situe à l'intérieur de l'Aéroport de Lomé plus précisément du côté Sud de la nouvelle aérogare.

Les travaux d'extension se dérouleront H24.

Description of the area concerned and period of work:

The new terminal of the GNASSINGBE EYADEMA International Airport (AIGE) covers an area of 21,000 m². The project consists of increasing the capacity of this terminal by an additional 2,608.48 m². The site where the works will be carried out (see the illustrative diagram in the appendix) is located inside the Lomé Airport, more precisely on the south side of the new terminal.

Extension work will be done H24.

Régulation :	**Regulation:**
Présence d'ouvriers et d'engins dans la zone des travaux. Suivre les instructions données par le contrôle aérien pour le roulage au sol.	*Presence of workers and engines in the work area. Follow the instructions given by the air traffic control for taxiing.*

EXTENSION DE L'AILE SUD DE LA NOUVELLE AEROGARE / *EXTENSION OF THE SOUTH WING OF THE NEW TERMINAL*

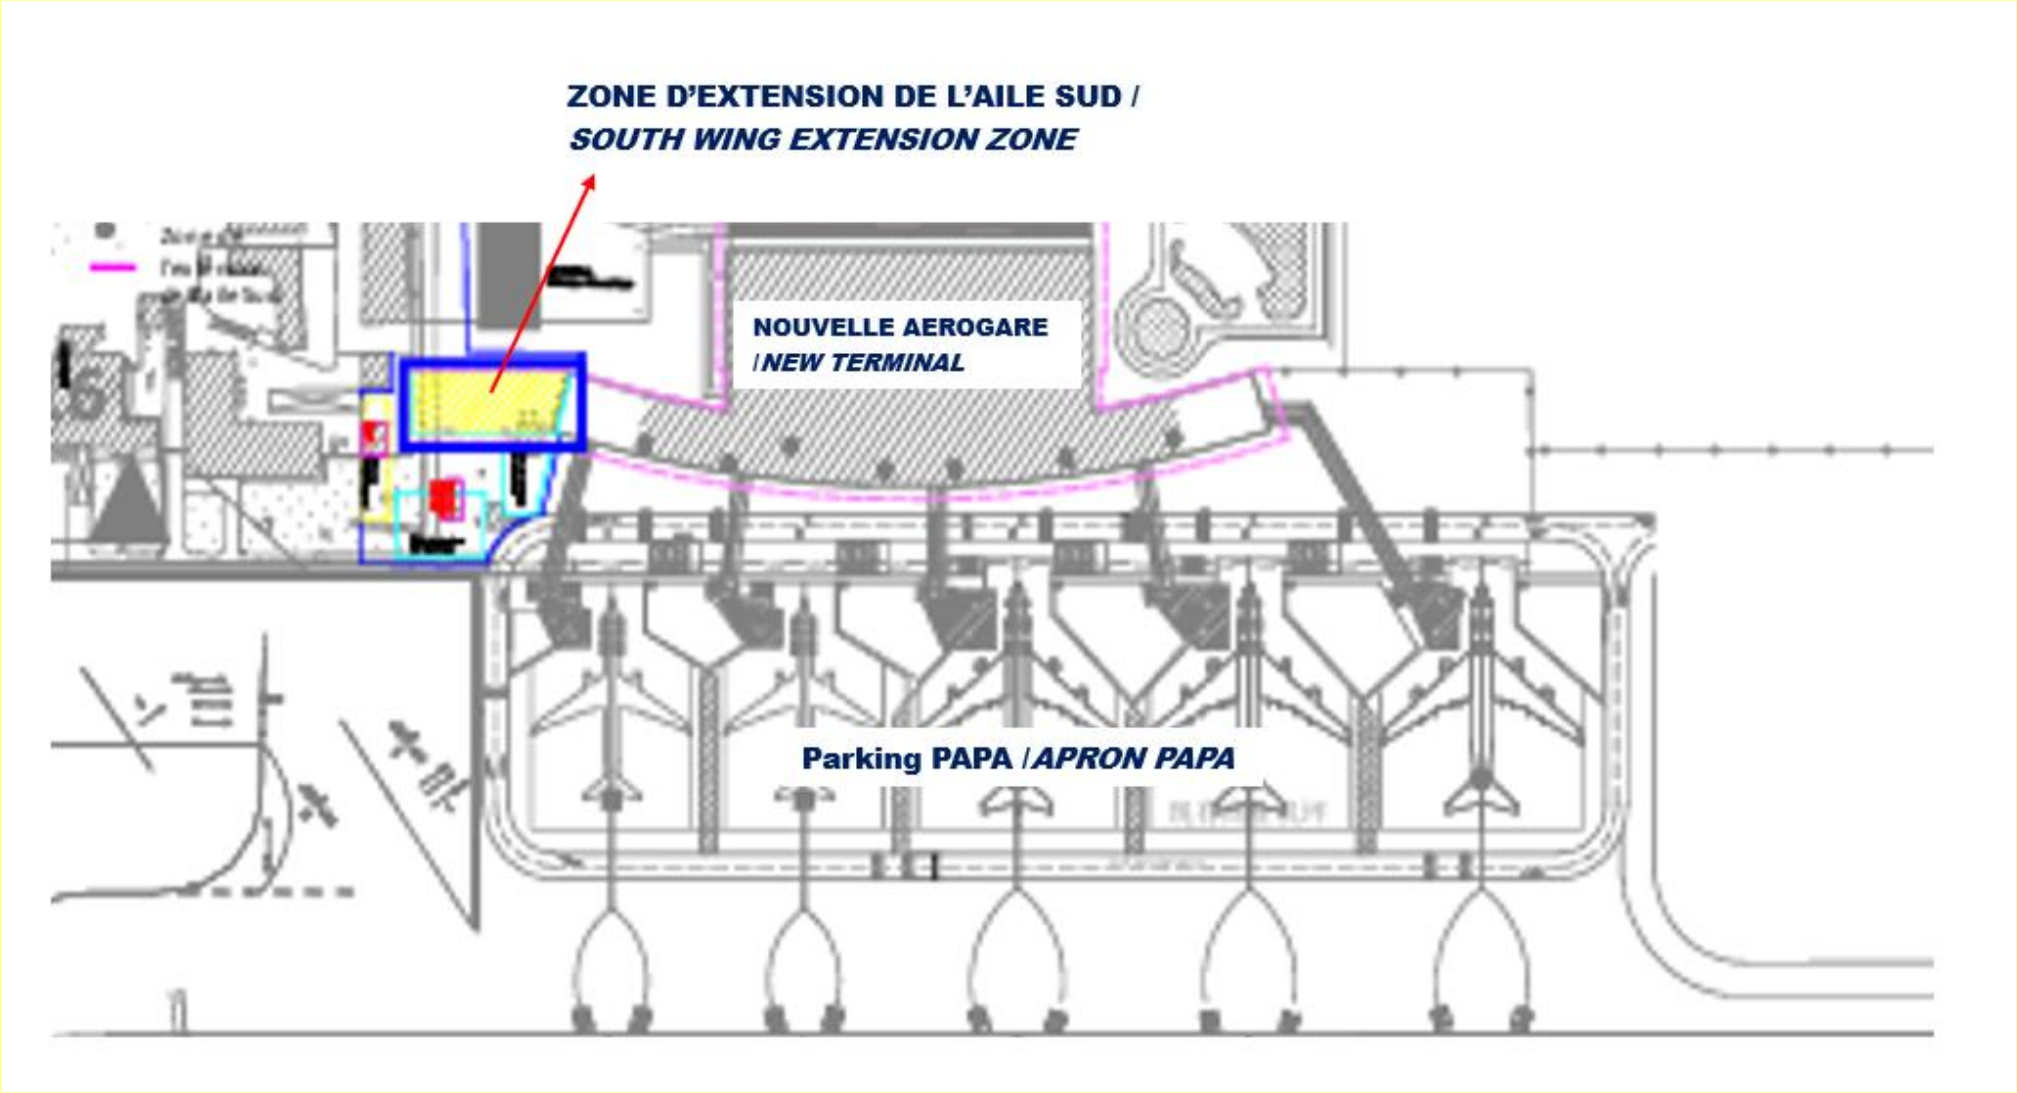

PHASES DES TRAVAUX / WORK PHASES			
Désignations / Designations	**Description des travaux / Designation Description of work**	**Durée des travaux / Duration of work**	**Observations / Observations**
Phase 0	Installation de chantier (Aménagement de la voie d'accès au chantier, clôture de chantier, aménagement de la base de production) Site installation (construction site access road, site fence, production base development)	1 mois 1 month	Délimitation de la zone du chantier par une clôture en tôle isolant ainsi la zone des travaux du côté ville Apport des matériaux et du matériel Sondage du site Nettoyage du site Utilisation des engins Présence d'ouvriers Demarcation of the construction site area by a sheet metal fence, thus isolating the work area on the landside Contribution of materials and equipment Site Survey Site Cleanup Use of the machines Presence of workers
Phase 1	Travaux d'extension de l'aile Sud de la nouvelle aérogare Extension work on the south wing of the new terminal building	11 mois 11 month	Terrassement Utilisation des engins (grue) Apport des matériaux Présence d'ouvriers Ouverture de tranchée Travaux au voisinage des câbles (MT, fibre optique, balisage…) et des tuyaux d'eau Earthworks Use of machinery (crane) Material supply Presence of workers Trench opening Work in the vicinity of cables (MV, fibre optics, marking, etc.) and water pipes

FIN/*END*
